



PROIECT IN DOI • Tudor (11) & tata

Casuta din copac



O casuta ridicata pe patru stalpi, cu un balcon in fata si copacul nostru transformat in masa. Asa o construim — pas cu pas.

01 Ce construim

Casuta nu se sprijina pe copac — copacul e prea subtire. Sta pe patru stalpi de lemn infipti in fundatiile de beton pe care le avem deja. Asa e sigura. Copacul ramane in fata, trece prin podeaua balconului si il retezam ca sa fie masa noastra.

SPATE

Casuta

Langa gard. Inchisa, cu perete si acoperis. Aici stam la adapost.

FATA

Balconul

Deschis, cu balustrada. Iese 70 cm peste stalpi ca sa cuprinda copacul.

MIJLOC

Masa-copac

Corcodusul retezat devine piciorul mesei. Blatul se prinde de podea, nu de copac.

02 Cotele importante

Toate masurate si confirmate pe teren. Cadrul e un dreptunghi perfect — ambele diagonale ies la 2750 mm.

2200

inaltime
podea (mm)

2100×1780

cadru stalpi (mm)

+700

balcon in
consola
(mm)

1300

perete
casuta (mm)

1000

balustrada
(mm)

Ø160

trunchi corcodus
(mm)

2750


diagonala
×2 (mm)

2480

adancime
totala (mm)


03 Vedere de sus

Asa arata privind de sus: casuta langa gard, balconul in fata, copacul cu masa la mijloc.

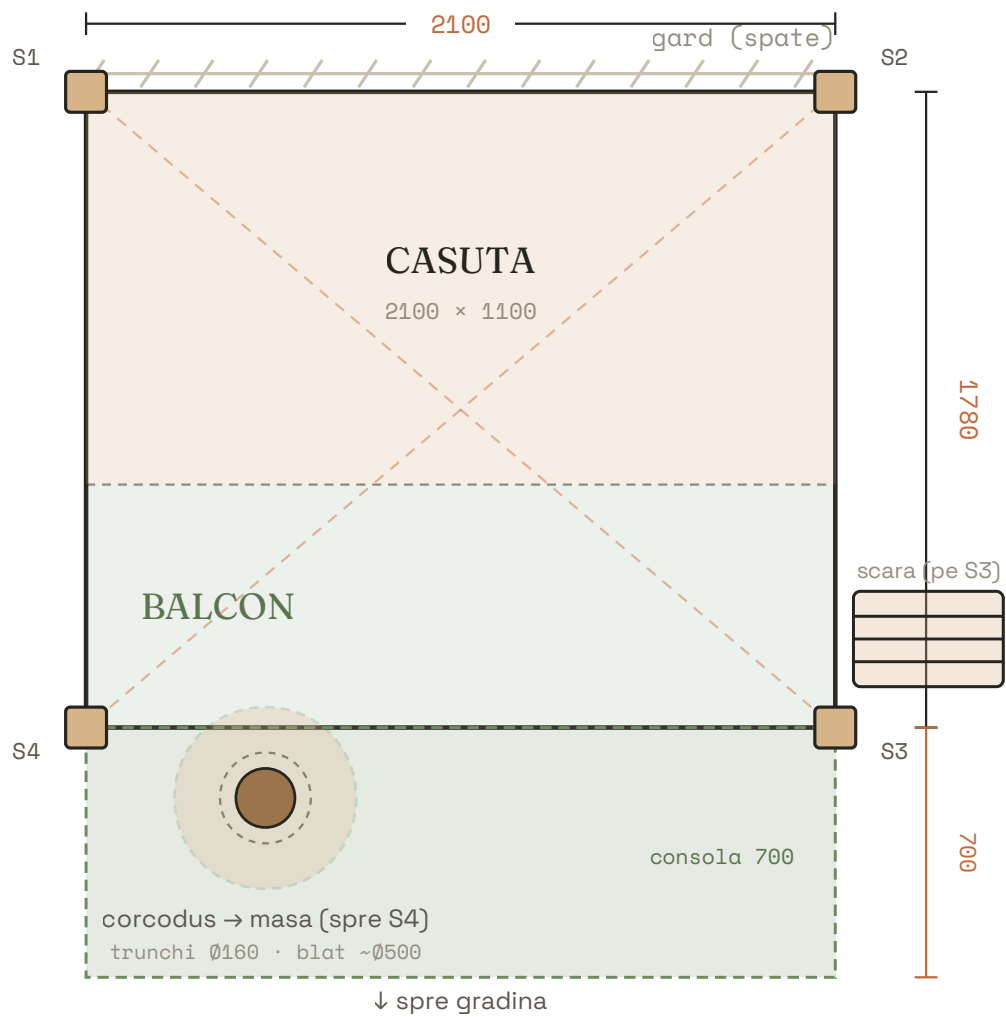

04 Cum se ridica


Vedere din lateral. Apasa **Reia constructia** ca sa vezi casuta crescand piesa cu piesa — de la stalpi pana la masa.

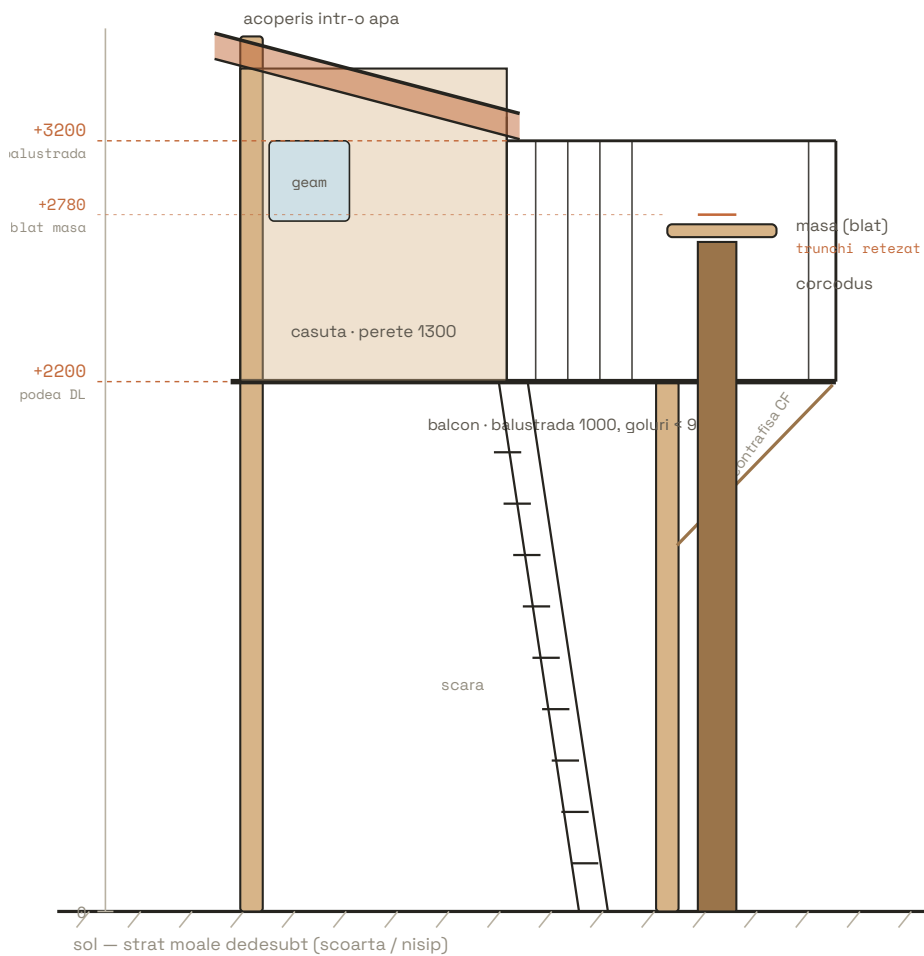

05 Detaliu: stalp, grinda si contrafisa


Patru desene simple, fiecare cu un singur lucru.

A · TALPA IN ANCORA · ST + B2

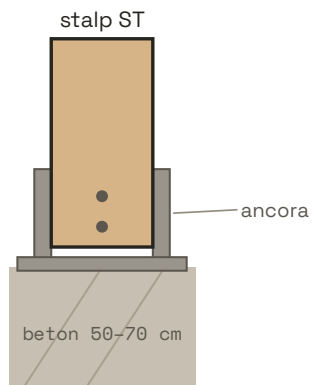


Stalpul sta intr-o ancora de metal prinsa in beton, ridicat putin ca apa sa nu-l putrezeasca.

B · GRINDA PE POLITA · GR · PO · B1

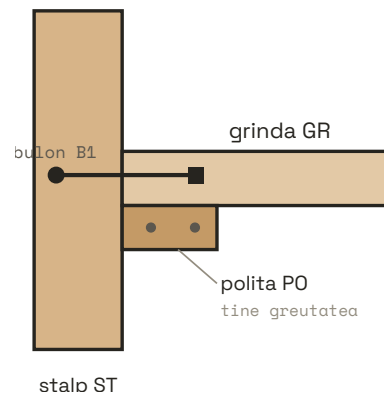


Grinda se aseaza pe o polita care duce greutatea. Bulonul doar o tine lipita.

C · CONTRAFISA · CF

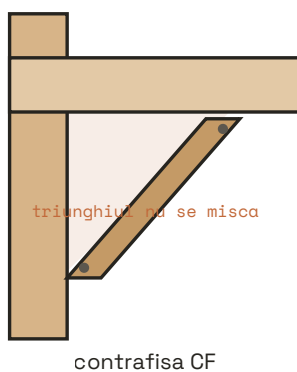

O diagonala face un triunghi din colt — iar triunghiul nu se deformeaza. Asa nu se clatina.

D · CEI DOI STALPI · ST

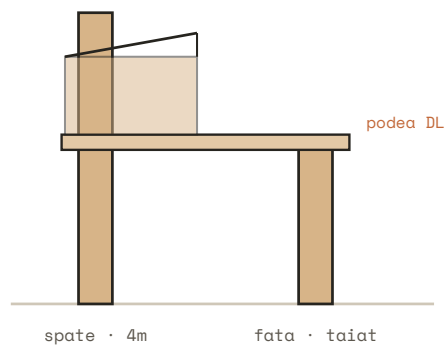

Stalpii din spate raman de 4 m si tin casuta. Cei din fata se taie la nivelul podelei.

06 Materiale

Cumparam de la Hornbach, Leroy Merlin si Dedeman. Detaliile complete cu preturi sunt in fisierul Excel din folder.

Ce avem deja

4 × Stalpi KVH 149 lei/
100×100×4000 buc

Hornbach · stalpii principali, rindeluiti

4 × Grinzi 87 lei/
100×100×4000 buc

Leroy Merlin · nerindeluite →
substructura / consola

Ce mai luam

 de
cumparat  de
decis

 Grinzi cadru (podea
+2200)

 Solute podea
(traverse)

 Dusumea balcon +
casuta

 Stalpisori + sipci
balustrada

 Scanduri
pereti

 Capriori
acoperis

 Invelitoare (policarbonat /
sindrila)

 Scara cu
balustrada

 Suruburi, coltare,
buloane

 Vopsea + grund
exterior

 Blat masa + cadru
fixare

 Sol moale
dedesubt

 Tobogan /
franghie

07 Etapele de constructie

In ordine. Pasii cu eticheta **CRITIC** sunt cei care strica tot daca-i grabim — la ei ne oprim si verificam de doua ori.

01

Prindem stalpii (ST) de fundatii **CRITIC**

Stalpii **ST** intra in papucii din beton, fixati cu buloane M12 (**B2**). Fiecare stalp perfect vertical, verificat cu nivela. Daca stalpii sunt stramb, tot restul iese stramb.

02

Montam grinzile glulam (GR) la +2200 **CRITIC**

Spate: **GR** pe polita (**PO**) + buloane M12 (**B1**). Fata: pe varful stalpilor + coltare (**C1**) cu suruburi (**H1**). Perfect orizontale — verificam cu nivela lunga sau laser pe ambele directii.

03

Asezam joistele (JO) **CRITIC**

Cele 6 joiste **JO** continue din spate pana in fata, cu consola de 700 mm peste grinda frontala, prinse cu coltare (**C2**). Plus contrafisa (**CF**) sub nas — altfel balconul sare sub picioare.

04

Batem dusumeaua larice (DL)

Scandurile **DL** prinse cu suruburi inox (**H4**), 5 mm intre ele. Lasam o gaura pentru copac, cu 3-5 cm joc jur-impjur ca trunchiul sa nu fie strans.

05

Ridicam peretii si acoperisul

Perete casuta 1300 mm, acoperis intr-o apa cu panta spre gradina (apa de ploaie curge in curtea noastra, nu la vecin).

06

Montam balustrada **CRITIC**

1000 mm inaltime, jur-impjurul balconului — inclusiv pe nasul consolei. Goluri sub 9 cm ca sa nu treaca un cap de copil.

07

Retezam corcodusul, facem masa

Taiem trunchiul la inaltimea blatului. Blatul se prinde de podea, nu de copac. Capatul retezat se teseste si se acopera sa scurga apa.

08

Montam scara cu balustrada

Trepte solide si mana curenta — niciodata franghie pentru urcat.

09

Finisaje + sol moale CRITIC

Slefui, grunduim, vopsim. Sub platforma punem strat moale (scoarta sau nisip) — amortizeaza o cadere.

10

Extra de joaca

Tobogan, franghie de catarat sau scripete cu galeata — partea cea mai distractiva.

08 Regulile de siguranta

Casuta e sus la 2,2 m. Astea nu sunt optionale.

01

Balustrada de 1 m jur-imprejur, goluri sub 9 cm. Si pe nasul consolei.

02

Sol moale sub platforma — scoarta, nisip sau iarba groasa. Niciodata beton sau piatra.

03

Scara cu trepte fixe si mana curenta. Fara franghie pentru urcat.

04

Niciun surub sau cui iese. Verificam imbinarile la inceput de fiecare vara.

05

Masa se sprijina pe cadrul ei, nu pe copac — trunchiul retezat putrezeste in timp.

06

Lemnul vopsit cu protectie de exterior, ca sa tina multi ani.



CASUTA DIN COPAC · v4 · proiect Tudor & tata · 2026

Schita de lucru — cotele se pot schimba pe masura ce construim.
